

제안요청서(RFP)

지역혁신대학교 중앙도서관 1 층 캠퍼스 라운지 리뉴얼 디자인·시공

교육용 가상 프로젝트 / 문서 버전 1.2

구분	내용
발주기관	지역혁신대학교 시설관리팀
사업유형	설계·시공 일괄(교육용 가상 설정)
문서목적	제 3 차시 RFP 분석 및 제 4 차시 제안 이미지 실습
작성일	2026 년 7 월 31 일
주의	실제 입찰·계약·실시설계·시공 문서가 아님

작성 및 이용 기준

본 문서는 영국 De Montfort University 의 공개 조달 공고 “268400 - Campus Lounge Fit Out”에서 확인되는 사업 유형과 조달 문서의 기본 구조를 참고하여 새롭게 작성한 교육용 가상 RFP 입니다. 사업명, 기관명, 대상 공간, 면적, 예산, 일정, 공간 요구사항, 참가조건과 평가 기준은 모두 강의 목적에 맞춰 별도로 구성했습니다. 본 문서는 실제 입찰, 계약, 실시설계 또는 시공의 근거로 사용할 수 없습니다.

1. 사업 개요

항목	요구 내용
사업명	지역혁신대학교 중앙도서관 1 층 캠퍼스 라운지 리뉴얼 디자인·시공
사업 목적	기존 구내식당형 공용공간을 학습·협업·휴식·교류가 공존하는 다목적 라운지로 전환
교육용 전체 평면 범위	약 900㎡ (36m × 25m)
리뉴얼 대상 범위	약 720㎡ (36m × 20m, 교육용 계획조건)
과업 제외구역	약 180㎡ (36m × 5m, 후면 조리실·직원 공용실)
사업비 상한	620,000,000 원 (부가가치세 포함, 교육용 가상 금액)
계약 방식	디자인·시공 일괄 제안
예상 수행기간	계약일로부터 90 일
운영조건	도서관 운영을 유지하며 단계별 공사계획 수립

1.1 추진 배경

- 현재 공간은 고정형 일반 테이블과 의자가 중심인 구내식당형 배치로, 개인학습·협업·짧은 체류·행사 운영을 동시에 지원하기 어렵다.
- 전원 사용 가능 좌석이 부족하고, 집중 활동과 대화 활동의 소음 간섭이 발생한다.
- 중앙도서관 1 층의 접근성과 자연광을 활용해 학생 체류시간과 공간 활용도를 높일 필요가 있다.
- 기존 구조와 주요 설비를 유지하면서 가구·조명·마감·전원·공간 구획(조닝)을 중심으로 개선한다.

1.2 사업 목표


- 개인 집중, 협업, 휴식, 단기 체류, 소규모 행사를 지원하는 복합 라운지 조성
- 총 120~140 석을 초기 계획목표로 검토하되, 좌석 수보다 활동 간 충돌 완화와 접근성을 우선
- 이동·재배치 가능한 가구를 활용해 학기·행사·운영 상황에 대응
- 기존 자산 재사용과 유지관리성을 고려한 지속 가능한 제안
- RFP 요구조건과 디자인 제안, 미확정 사항을 명확히 구분한 제안서 작성

2. 대상 공간 및 현황 조건

구분	현황 및 조건	제안 시 유의사항
공간 형태	전체 36m × 25m 직사각형 평면	남측 5m 깊이 제외구역을 제외한 720㎡가 대상
층고	구조체 기준 약 3.6m / 기존 마감천장 약 2.7m	기존 천장 유지안을 기본으로 검토하며, 전면 철거 안은 별도 대안으로 표시하고 구조·설비 검토 필요
구조	약 6m 내외 기둥 그리드	기둥·구조벽 이동 및 철거 불가
창호	북측 연속 창호	창호 위치·크기 변경 불가, 자연광 활용
출입	서측 도서관 로비에서 주 진입	기존 주 출입 위치 유지
기존 시설	동측 서빙 카운터 3개, 안내·보안 영역	철거·축소·재사용 대안 제시 가능
전기	현황 용량은 별도 실사 필요	전원 사용 가능 좌석 48 석 이상을 개념 계획하고, 실제 배선 경로와 증설 가능 여부는 전문가 검토
운영	도서관 운영 중 단계별 공사	소음·분진·안전·피난 동선 계획 필요

2.1 교육용 현황 평면도

교육용 가상 현황 평면도 (실측·시공도면 아님)

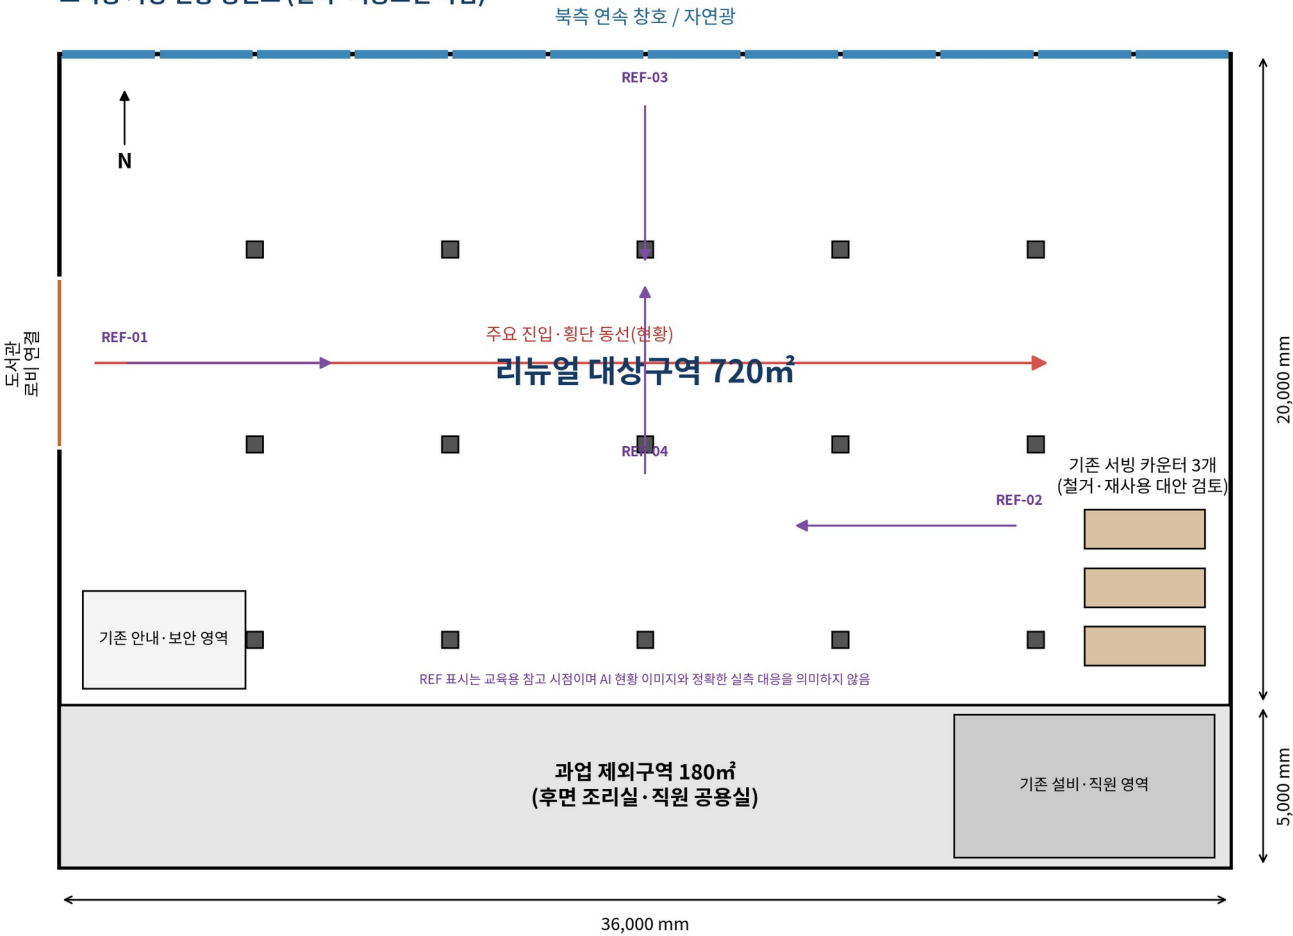

※ 치수와 구역은 수업용 계획조건이며 실측도면 또는 시공도면이 아닙니다.

3. 현황 이미지

아래 이미지는 가상 대상 공간의 분위기와 기존 구성요소를 설명하기 위한 교육용 AI 생성 참고 이미지입니다. 동일한 실측 공간을 촬영한 현황 사진이 아니며, 평면도와 정확한 형상·치수·기동·창호·설비 위치가 일치한다고 해석해서는 안 됩니다. 실제 치수, 구조 안전, 설비 위치 또는 법규 충족 여부는 이미지로 판정할 수 없습니다.




현황 사진 01 - 서측 로비 진입부



현황 사진 02 - 기존 카운터 방향



현황 사진 03 - 북측 창가 영역

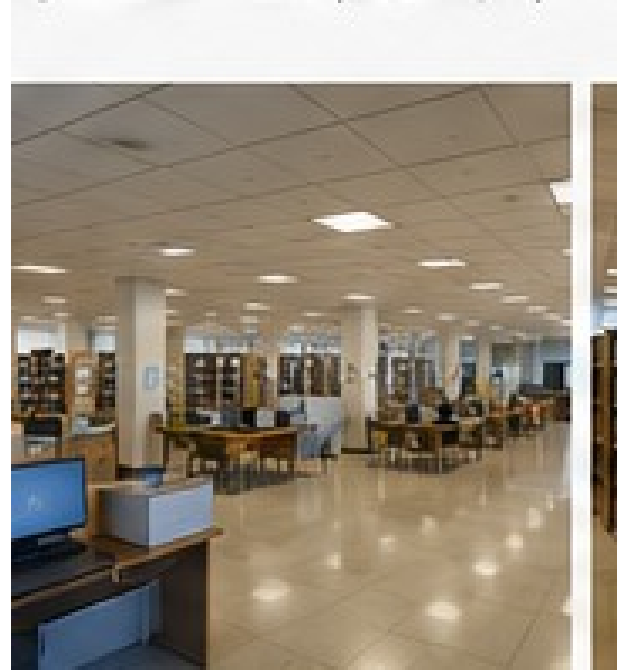

현황 사진 04 - 개방형 기존 좌석 영역

3.1 기존 가구·시설 목록

구분	수량	상태	처리 원칙
4 인용 테이블	24 개	사용 흔적 있음	현장 실사 후 8 개 이상 우선 재사용 검토
일반 의자	96 개	일부 마모	현장 실사 후 32 개 이상 우선 재사용 검토
하이테이블	8 개	보통	퀵 스테이 영역 재사용 검토
스툴	16 개	보통	재배치 가능
서빙 카운터	3 개	고정형	1 개 유지 또는 통합안 제시
자판기	2 대	운영 중	위치 조정 가능 여부 협의

4. 과업 범위

4.1 포함 과업

- 현황자료 검토 및 현장 확인 계획 수립
- 공간 프로그램과 사용자 활동을 반영한 개념 구획(조닝) 대안 2 개 이상
- 인테리어 콘셉트, 색채, 마감, 조명 및 가구 방향 제안
- 평면도, 천장도, 주요 입면도, 가구배치도와 주요 상세 방향 작성
- 주요 시점 3D 시각화 3 장 이상
- 전원 사용 좌석 및 기본 조명·전기 위치의 개념 계획
- 기존 가구·시설 재사용 검토와 철거·신설 구분
- 공사 단계, 안전·소음·분진·운영 동선 관리 계획
- 수량·단가·공종이 구분된 가격제안서와 공정표
- 준공도서, 유지관리 자료와 하자 대응계획

4.2 과업 제외 및 별도 협의

- 주요 구조체 철거·신설 및 구조보강 설계
- 냉난방 주설비, 승강기, 소방 주설비의 전면 교체
- Wi-Fi, 서버, CCTV, 방송 시스템 구축
- 남측 후면 조리실 및 직원 공용실 리뉴얼
- 인허가 대행 및 구조·소방·기계·전기 등 분야별 전문설계 확정
- 미확정 전기 용량을 전제로 한 실제 증설 확정

4.3 제안자의 책임

- RFP 에 명시된 조건, 제안자가 가정한 조건, 추가 확인이 필요한 조건을 구분해 표시한다.
- AI 를 활용한 분석·이미지·문서 작성 시 사용 범위와 사람의 검토 내용을 기록한다.
- 생성 이미지로 구조·법규·설비·시공성 충족을 단정하지 않는다.

5. 공간 프로그램 및 기능 요구사항

필수 영역	면적 배분	좌석·수용 조건	핵심 요구사항
개인 집중 영역	대안별 제안	전체 목표 내 산정	장시간 학습, 전원 접근, 흡음, 시선 분리
협업 영역	대안별 제안	2~6 인 단위 구성	이동형 가구, 공용 작업면, 대화 활동 지원
휴식 라운지	대안별 제안	대안별 산정	다양한 착석, 자연광 활용, 편안한 체류
퀵 스테이	대안별 제안	단시간 이용 좌석	출입구 인접, 짧은 체류, 하이테이블 검토
다목적 전환 영역	대안별 제안	가변 수용	소규모 발표·행사, 가구 이동과 전환성
운영 수납·분리배출	대안별 제안	좌석 없음	운영자 접근, 시야 방해 최소화, 관리 동선
주동선·완충 영역	대안별 제안	좌석 없음	영역 간 충돌 완화, 접근성, 안전한 이동
전체 대상 범위	720㎡ 이내	전체 120~140 석 계획목표	구체적 면적과 좌석 배분은 대안별 운영 논리에 따라 제안

5.1 수치 요구조건

ID	요구조건	판정 방식
REQ-01	전체 좌석 120~140 석을 초기 계획목표로 검토하되 접근성과 동선을 우선	평면도·좌석표
REQ-02	전원 사용 가능 좌석 최소 48 석	전원 위치 개념계획
REQ-03	휠체어 접근 가능 좌석 최소 6 석	평면도·접근 동선
REQ-04	교육용 대안 비교를 위한 주요 통로 폭 1.5m 이상 (법정 최소폭을 의미하지 않음)	평면도
REQ-05	현장 실사에서 재사용 가능 판정을 받은 기존 테이블·의자의 30% 이상 우선 재사용 검토	재사용 목록
REQ-06	운영 논리가 다른 공간 대안 2 개 이상	대안 비교표
REQ-07	북측 자연광 활용 및 창호 변경 금지	평면·시각화
REQ-08	집중 영역과 대화·행사 영역의 간섭 완화	조닝·설명

6. 디자인·성능·운영 요구조건

분류	요구 내용
디자인 방향	기존 구내식당 이미지를 줄이고 차별하고 전문적인 캠퍼스 라운지 분위기를 조성한다. 단순 장식보다 활동과 운영 논리를 우선한다.
가구	내구성·유지관리성·재배치 가능성을 고려한다. 전통식 가구는 기본 과업에서 제외한다.
마감	다수가 이용하는 공간에 적합한 내구성, 청소 용이성, 미끄럼 저항 및 방염 성능을 검토할 수 있는 재료 방향을 제안한다.
조명	집중·협업·휴식 영역별로 조도와 분위기 차이를 제안하되 실제 조도 계산은 후속 전문 검토 대상으로 한다.
음환경	흡음재·가구·배치·완충영역으로 집중 활동과 대화 활동의 간섭을 줄인다.
접근성	휠체어 이용자와 다양한 사용자가 접근 가능한 좌석과 이동경로를 계획한다. 실제 법규 충족은 전문가가 검토한다.
운영	도서관 운영 중 공사를 전제로 단계별 구획, 안전, 소음, 분진, 피난 동선 계획을 제시한다.
초기 시각화	기존 마감천장 높이와 주요 구조·창호 위치를 유지하는 안을 기본으로 한다. 노출천장 또는 천장 전면 철거안은 별도 대안으로 구분하며 실제 가능 여부를 확정하지 않는다.
전원 표현	이미지에서는 전원 사용이 가능한 좌석을 개념적으로 표현할 수 있으나 실제 배선 경로, 용량 및 증설 가능 여부를 확정하지 않는다.
AI 활용	AI가 생성한 분석·이미지의 근거, 수정 이력, 미확정 조건을 기록하며 결과를 설계 확정안으로 표현하지 않는다.

6.1 대안 제안 원칙

- 서로 다른 공간 운영 논리를 가진 대안 2개 이상을 제안한다.
- 대안 간 차이는 색상이나 장식 스타일이 아니라 공간의 우선순위, 구획, 동선, 좌석 구성과 가구 운영 방식에서 드러나야 한다.
- 대안의 명칭과 구체적인 방향은 제안자가 RFP 분석과 디자인 전략을 바탕으로 도출하며, 각 대안의 장단점과 미확정 조건을 함께 제시한다.

7. 제안 산출물

구분	필수 산출물	형식/수량
기술제안 요약	사업 이해, 핵심 전략, 가정·질의·제약조건 의 구분	문서 1 식
공간 대안	운영 논리가 다른 개념 구획(조닝), 동선과 설 명	2 안 이상
기본 계획도	평면, 가구 배치, 좌석, 동선과 기존 조건 유 지 계획	PDF
천장·조명·재료	천장, 조명, 마감, 가구와 음환경의 기본 방향	PDF
3D 시각화	대안별 대표 시점 및 선택안의 주요 시점 이 미지	대안별 1 장 이상 / 선택안 3 장 이상
비교자료	대안별 RFP 반영 여부, 장단점, 미확정 항목	비교표 1 식
가격제안	공종·수량·단가·합계와 예비비 구분	스프레드시트/PDF
수행계획	공정, 안전, 위험, 운영 중 시공, 품질관리	문서 1 식
계약 후 최종자료	준공도서, 유지관리, 자산 목록과 수정 기록	전자파일 1 식

7.1 디지털 제작 및 AI 활용 고지

- AI 또는 생성형 도구를 사용한 경우 사용 도구와 서비스 화면상의 표시명을 기록한다.
- 입력 자료와 요청문, 적용 범위, 사람이 확인한 내용을 기록한다.
- 최초 결과와 주요 수정 결과를 구분해 보관한다.
- 결과에서 유지·수정·제외한 요소와 판단 근거를 기록한다.
- 도구가 임의로 추가한 요소와 원본 자료로 확인할 수 없는 내용을 표시한다.

8. 제안서 작성·제출 및 입찰 요구사항

8.1 제출 문서

번호	문서	요구사항
1	기술제안서	A4 기준 30 쪽 이내, 부록 제외
2	가격제안서	부가가치세 포함 총액 및 세부 내역
3	수행조직·일정	책임자, 참여인력, 공정표
4	유사 수행실적	최근 5 년 이내 교육·공공·상업공간 관련
5	확약서	보안, 저작권, 이해충돌, 제안 유효기간 60 일
6	디지털 제작·AI 활용 고지	사용 범위, 입력 자료, 수정 및 사람 검토 기록

8.2 교육용 역할 설정 - 실제 입찰자격 아님

본 항목은 제안서 구조를 이해하기 위한 가상 참여조건입니다. 실제 업종 등록, 면허, 공동수급 및 입찰 참가자격은 해당 국가와 발주기관의 법률·조달 기준에 따라 별도로 작성해야 합니다.

- 본 교육용 프로젝트의 설계·시공 역할을 수행할 수 있는 조직과 담당자를 제시한 사업자
- 공고일 기준 휴·폐업, 부정당업자 제재 또는 중대한 계약상 결격사유가 없는 사업자
- 설계와 시공의 통합 수행이 가능하거나 역할과 책임이 명확한 공동수행 체계를 제시할 수 있는 사업자
- 현장설명 및 질의 절차에 참여하고 요구된 제출형식을 준수하는 사업자

8.3 교육용 제안 일정

절차	일정
RFP 배포	2026.08.05
사전 질의 마감	2026.08.10 17:00
질의 회신	2026.08.12
제안서 제출	2026.08.19 15:00
제안 발표 및 평가	2026.08.21
우선협상대상자 통보 및 계약 협의	2026.08.24 이후

9. 평가 기준

평가영역	세부항목	배점
사업 이해	RFP 조건, 현황, 포함·제외 범위의 이해	15
공간 계획	활동별 조닝, 동선, 좌석, 접근성, 운영 논리	20
디자인 품질	컨셉트, 재료·가구·조명 방향, 시각화 완성도	15
구현 가능성	기존 구조·설비 유지, 단계별 시공, 위험관리	10
지속가능·유지관리	기존 자산 재사용, 내구성, 관리 용이성	5
요구조건 추적성	RFP 근거, 가정, 질의와 디자인 제안의 구분	5
기술평가 소계		70
가격평가	총액 및 세부 가격의 적정성	30
합계		100

9.1 평가 유의사항

- 이미지의 미적 완성도만으로 우수안을 판단하지 않는다.
- RFP 요구조건을 충족하지 못하거나 근거 없는 구조·치수·설비 변경을 확정된 경우 감점할 수 있다.
- 미확정 조건을 질문이나 가정으로 분리한 제안은 불완전한 제안이 아니라 검증 가능한 제안으로 평가한다.

10. 계약 및 유의사항

- 본 교육용 RFP의 사업비·기간·참가조건은 실제 법적 입찰요건이 아니며 수업용으로만 사용한다.
- 제안자는 현황자료의 불일치를 발견하면 임의로 보정하지 말고 질의사항으로 제출한다.
- 공사 범위와 설계 변경은 발주기관의 서면 승인 후 확정한다.
- 제안 과정에서 사용한 제 3 자 이미지·폰트·자료의 이용 권리를 확인한다.
- AI 생성물은 저작권·상표·개인정보·기밀정보와 사실성 검토 후 사용한다.
- 실제 구조, 소방, 전기, 기계, 접근성, 법규, 공사비와 공정은 해당 전문가와 현장자료로 별도 검증한다.

10.1 교육용 출처 및 재구성 고지

참고 원문: De Montfort University, “268400 - Campus Lounge Fit Out”, Find a Tender, Notice 2026/S 000-018099, published 27 February 2026. 원문은 약 850㎡의 구내식당형 공간을 다목적 캠퍼스 라운지로 전환하는 디자인·시공 사업으로, 2~3 개 3D 시각화, 상세 평면, 가격표, 공정·위험관리, 품질 70%·가격 30% 평가 등을 제시합니다.

라이선스: Find a Tender 의 대부분 콘텐츠는 Open Government Licence v3.0 에 따라 제공되며, 일부 예외 콘텐츠는 별도 조건이 적용될 수 있습니다. 본 문서는 해당 프로젝트 유형과 조달 구조만 참고했으며, 지역혁신대학교, 면적, 예산, 공간 프로그램, 요구조건, 참가자격, 평가표와 일정은 모두 교육용으로 새롭게 작성했습니다.

10.2 원문 확인 정보

항목	내용
원문 제목	268400 - Campus Lounge Fit Out
공개기관	De Montfort University / Find a Tender
광고번호	2026/S 000-018099
원문 주소	https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/018099-2026
라이선스	Open Government Licence v3.0 (일부 예외 콘텐츠 제외)
필수 출처표시	Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
